

# 復旧・復興の進捗状況と今後の取組


## 目次

- 公共土木施設の復旧工事の進捗状況…………… 1
- 災害に強いまちづくり宮城モデルの構築の進捗状況 …… 4
- 入札執行状況及び対策 …… 8
- 復興まちづくりの加速化 …… 10

宮城県土木部







# 公共土木施設の復旧工事の進捗状況 (公共土木施設災害復旧事業：県事業)

○「次世代に豊かさを引き継ぐことのできる持続可能なみやぎの県土づくり」の理念のもと、県民の命と生活を守り、震災を乗り越え、更なる発展につなげる県土づくりを目指して取り組んでいます。

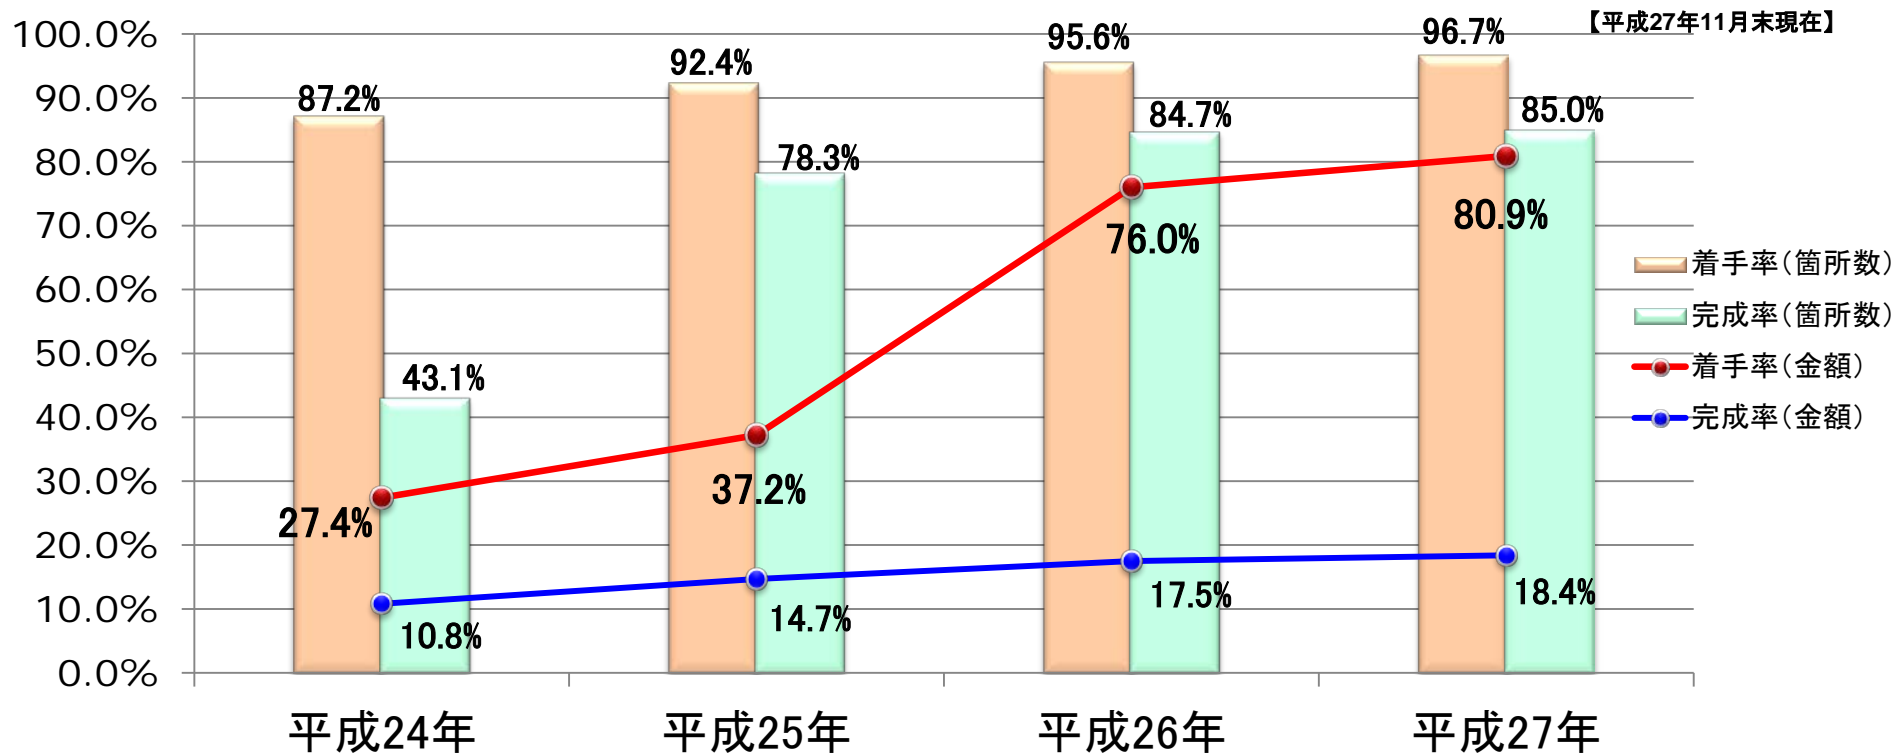


	道路橋梁施設	河川施設	海岸保全施設	砂防・地滑・急傾斜施設	下水道施設	港湾施設	公園	合計
復旧費(億円)	773	3,416	999	8	396	884	16	6,492億円
箇所数	1,538	274	74	8	121	292	7	2,314箇所

## ○施設別進捗状況 (公園除く)

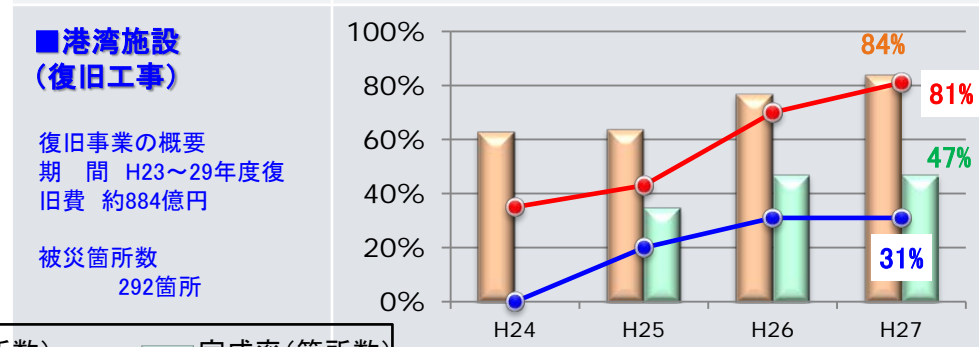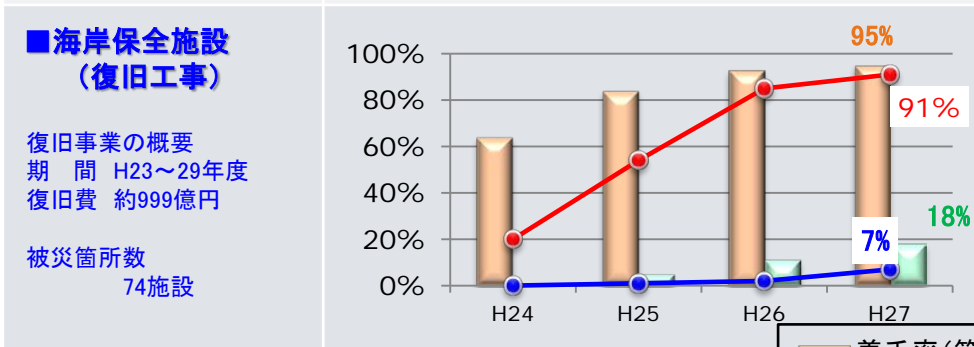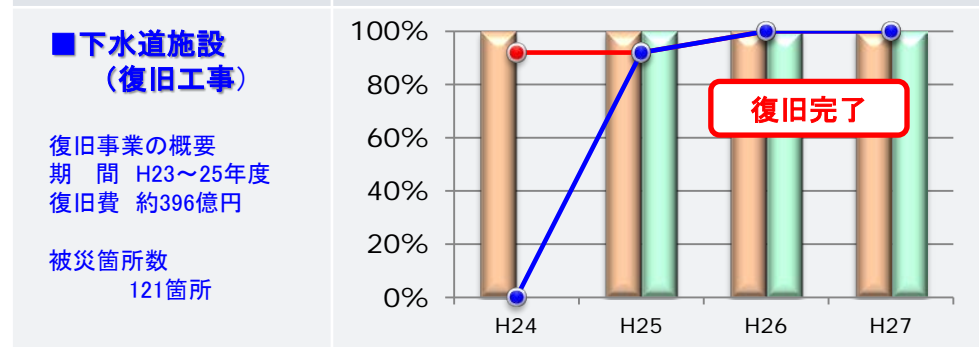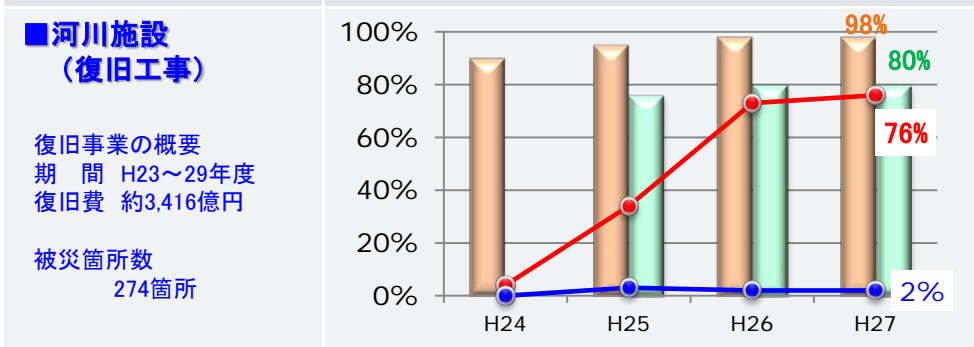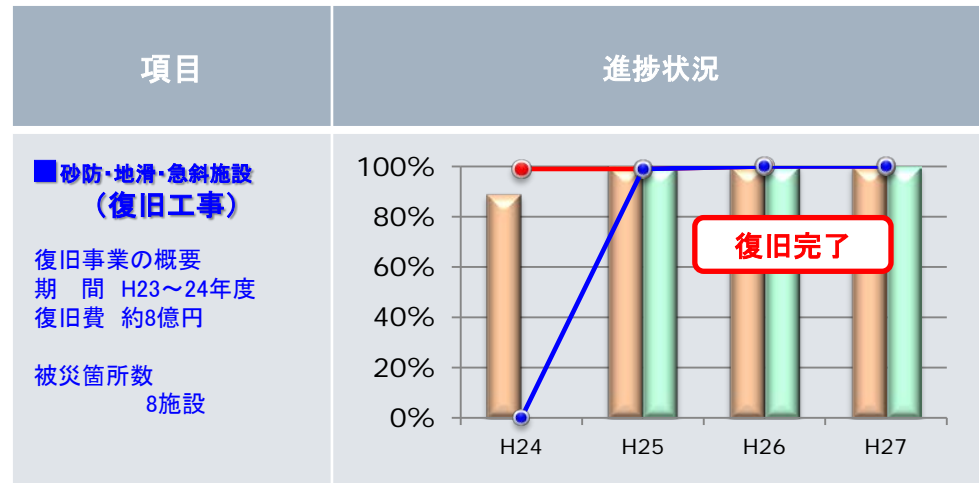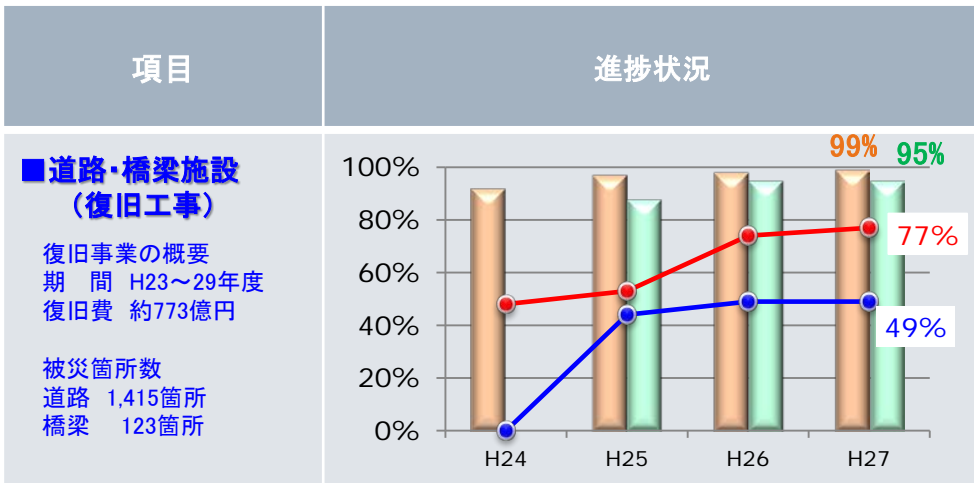

■ 着手率(箇所数)      ■ 完成率(箇所数)  
● 着手率(金額)      ● 完成率(金額)

# 公共土木施設の復旧工事の進捗状況

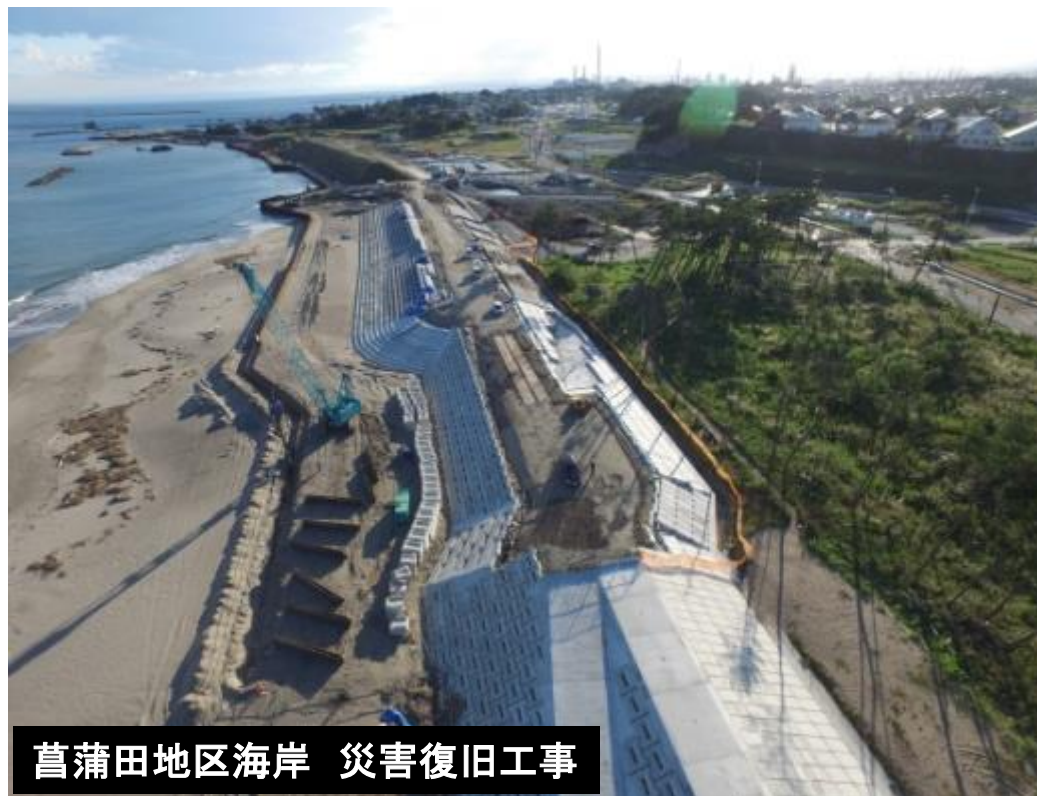

菖蒲田地区海岸 災害復旧工事



南貞山運河 災害復旧工事





野々島地先海岸 災害復旧工事



仙台湾南部海岸 災害復旧工事

# 災害に強いまちづくり宮城モデルの構築の進捗状況

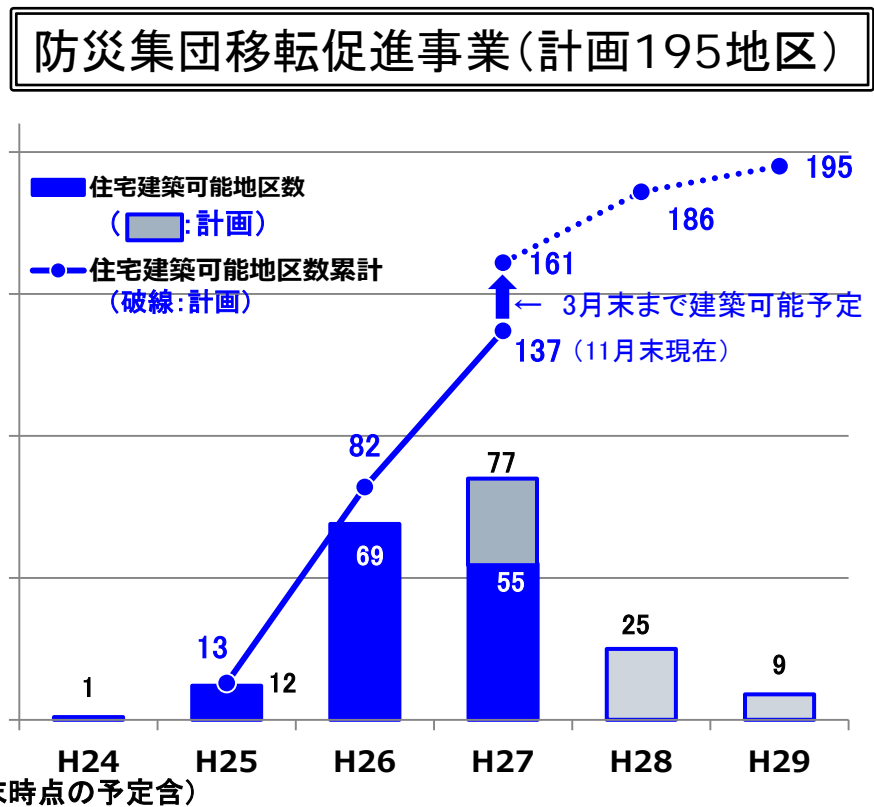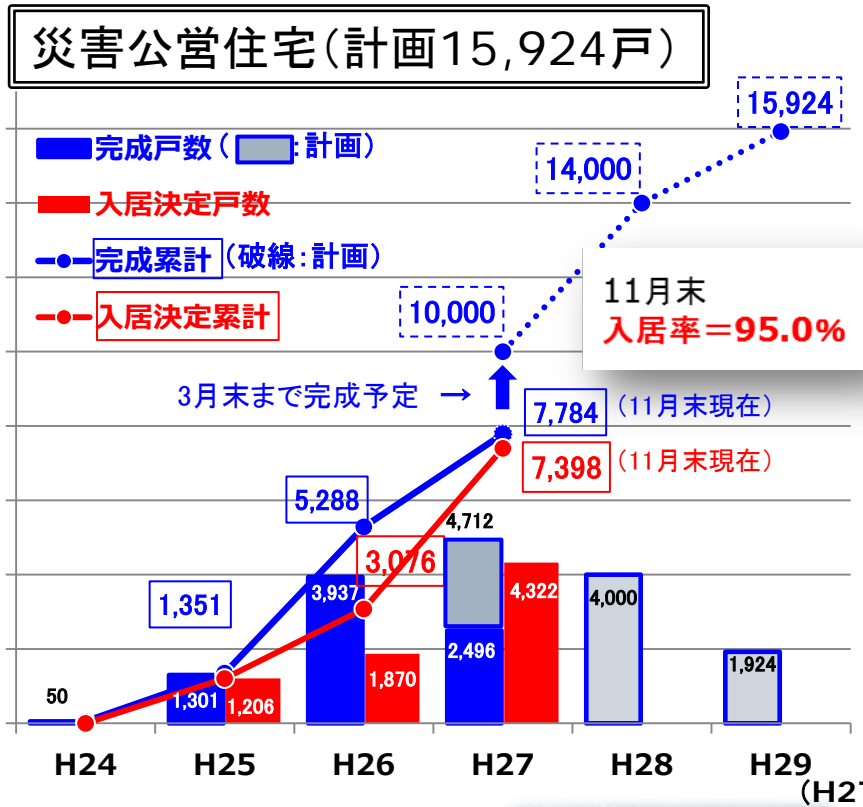

# 復興まちづくりの状況①

## 岩沼市 玉浦西地区

岩沼市では、震災後、沿岸の6地区を1箇所(玉浦西地区)に集約し、それぞれのコミュニティを保ちながらひとつの町を作り上げた。

玉浦西地区は県内初の内陸移転団地であり、沢山の住宅が建ち、新しい町並みが形成されている。



平成27年7月19日  
玉浦西まち開きが開催された。

沢山の人が訪れた  
玉浦西まち開きの様子

玉浦西地区災害公営住宅



第27回住生活月間功労者表彰 国土交通大臣表彰受賞



## 石巻市 新市街地6地区



石巻市では、平成27年11月3日、被災市街地復興土地区画整理事業を実施している新市街地6地区について、まち開き式典を開催した。

# 復興まちづくりの状況②



南三陸町志津川地区 全景

## 南三陸町志津川地区

- 平成27年10月24日、旧五日町エリアの観光交流拠点整備予定地の見学会が開催された。
- 平成27年12月14日、地域医療と福祉の拠点となる南三陸病院・総合ケアセンター南三陸が完成し、開業した。



南三陸病院・総合ケアセンター南三陸 完成



女川町中心部地区 全景



女川まち開き(JR石巻線女川駅開業)

## 女川町中心部地区

- 平成27年3月21日、女川駅周辺まち開き開催に合わせ、JR石巻線が全線運転再開した。
- 平成27年12月23日、駅前商業エリアの完成に伴う、第2弾まち開きを開催予定。



駅前商業エリア施工状況

# みやぎの復興を支える社会基盤の整備

## 復興支援道路

### みやぎ県北高速幹線道路の整備

- 平成23年11月24日、I期区間L=9.0kmが供用開始
- II期L=4.7km、III期L=3.6km、IV期L=1.7kmについても事業着手し、全区間において事業中



## 復興道路 三陸沿岸道路の整備

- 東日本大震災からのリーディングプロジェクトである「三陸沿岸道路」において新規事業全区間で事業着手
- 暫定2車線供用中の区間についても、4車線化着手




## JR仙石線及び石巻線全線運転再開



平成27年5月30日、東名駅及び野蒜駅の高台移転が完了し、JR仙石線が全線運転再開した。  
平成27年3月21日、JR石巻線が全線運転再開し、併せて「おながわ復興まちびらき」が開催された。

## 仙台空港民営化

- 平成27年12月1日、国土交通省と仙台国際空港(株)と仙台空港特定運営事業等に係る公共施設等運営権実施契約の締結
- 平成28年7月、民営化へ移行予定



## 常磐自動車道の全線開通



- 平成26年12月6日、相馬IC～山元IC間が開通した。
- 平成27年3月1日、常磐富岡IC～浪江IC間が開通し、常磐自動車道が全線開通した。
- 仙台～東京間でのダブルネットワークが形成
- 拠点都市間のアクセス向上（仙台市～浪江町間 21分短縮）



## 仙台松島道路 全線4車線化

平成24年7月12日、利府中IC～松島海岸IC約4.0kmが完成した。  
平成26年3月25日、松島海岸IC～松島北IC約7.5kmが完成した。  
平成27年3月30日、松島北IC～鳴瀬奥松島IC約6.8kmが完成し全線4車線化となった。



## 国際拠点港湾 仙台塩釜港


- 岸壁等の復旧事業は完了し、完成自動車等貨物の混雑解消及び船舶の大型化に対応する物流ターミナルを整備
- 新規外航コンテナ航路が相次いで開設し、航路数は8航路となり過去最高を記録






# 入札執行状況及び対策

## 不調率推移

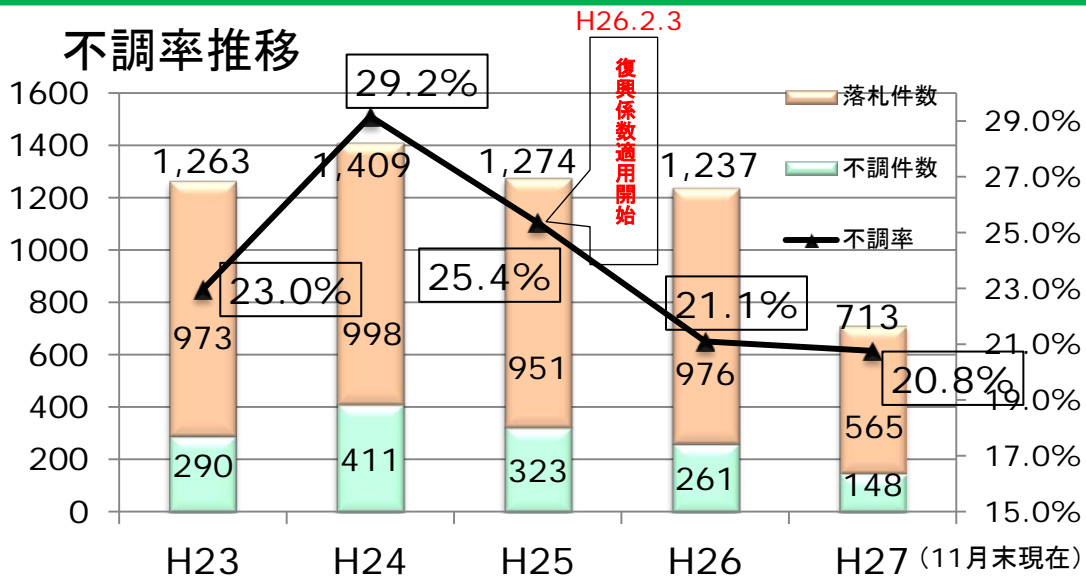

## 災害公営住宅関係不調率推移(県発注)

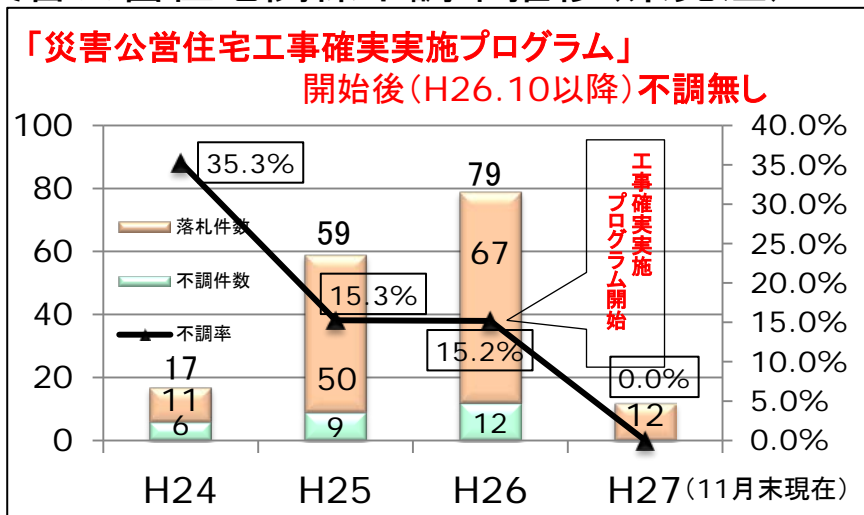

平成**26**年度の一般競争入札**1,237**件（落札件数**976**件 不調件数**261**件 不調率**21.1%**）  
 平成26年**3**月末時点 実不調率・・・**5.8%** ➡ **11**月末現在 **2.2%**

入札不調となった工事については、**入札参加者の地域要件や入札方式等を見直し**ながら、再度入札を行うことにより、**ほぼ契約に至っている**。

平成**27**年度(11月31日現在)

一般競争入札**713**件 落札件数**565**件 不調件数**148**件 不調率**20.8%**

	H26.11	H27.11	差
全体	21.2%	20.8%	-0.4%
1億円以上	25.1%	18.9%	-6.2%
1億円未満	18.1%	21.9%	3.8%

**復興係数の採用等**により、**1億円以上の発注案件**は去年同期比**約6%改善**。  
 今後も施工確保対策を継続し更なる不調率の改善に取り組む。

# これまで実施している主な対策

## ■ 企業が応札しやすい環境整備

### ①発注見通しの統合

- ・国, 県, 市町村の**情報の一元化(毎月公表)**

### ②入札参加条件(県外企業等の参入機会)の拡大

- ・WTO対象工事において不調が発生した場合に, 単独を加えた混合入札を実施

### ③建設資材の確保

- ・公共関与型生コン仮設プラント稼働中(2地区4箇所)

## ■ 技術者等の確保

### ④発注ロットの更なる大型化

- ・地域特性を考慮し, 近接する道路, 河川工事を一括発注

### ⑤発注時期の調整・平準化, 適正工期の設定

- ・平成28年度以降の工期設定(平成26年度公告案件以降)

### ⑥着手指定日を設定した工事の発注

- ・**工事契約後60日以内まで工事着手を猶予**、手持ち工事のある技術者の入札参加が可能



【牡鹿プラント(石巻市)】

## ■ 予定価格の適切な算出, 設計変更

### ⑦国の新たな施工確保対策の即時実施

- ・**復興係数による間接工事費の補正**, 建設機械3種の損料割増の実施
- ・急激な物価変動に伴う請負代金額変更の適切な運用

### ⑧地域特性, 現場条件を踏まえた施工計画・仮設計画, 積算の徹底

- ・気仙沼地区, 東部(石巻)地区, 離半島部等における配慮・工夫等

### ⑨施工確保対策の市町村・関係業界への周知徹底

- ・設計労務単価の改訂, 間接工事費の被災地補正, 単品スライド簡素化等

# 復興まちづくりの加速化①

## ■ 新たな市街地や移転元地への企業誘致に向けた支援



●新たなまちへの商店などの生活利便施設、防災集団移転元地への産業誘導を支援するため、UR都市機構と共同で誘致対象の用地を紹介するパンフレットの作成と企業アンケートを実施。

- 産業商業用地を広くPR！
- 住み継がれるまちへ賑わいの場の確保！
- 移転元地を活用した働く場の確保！



### パンフレット

県内のインフラ状況、産業商業用地の概要、各種優遇制度の案内など掲載

### 企業アンケート


発送数：全国約5,000社  
(12月上旬から順次発送中)

業種：小売商業、飲食などの生活利便施設、水産加工・食品加工業、東経連などの団体会員等

内容：立地の意向、立地希望地域、施設規模など9項目

# 復興まちづくりの加速化②

## ■ 復興まちづくり事業カルテ

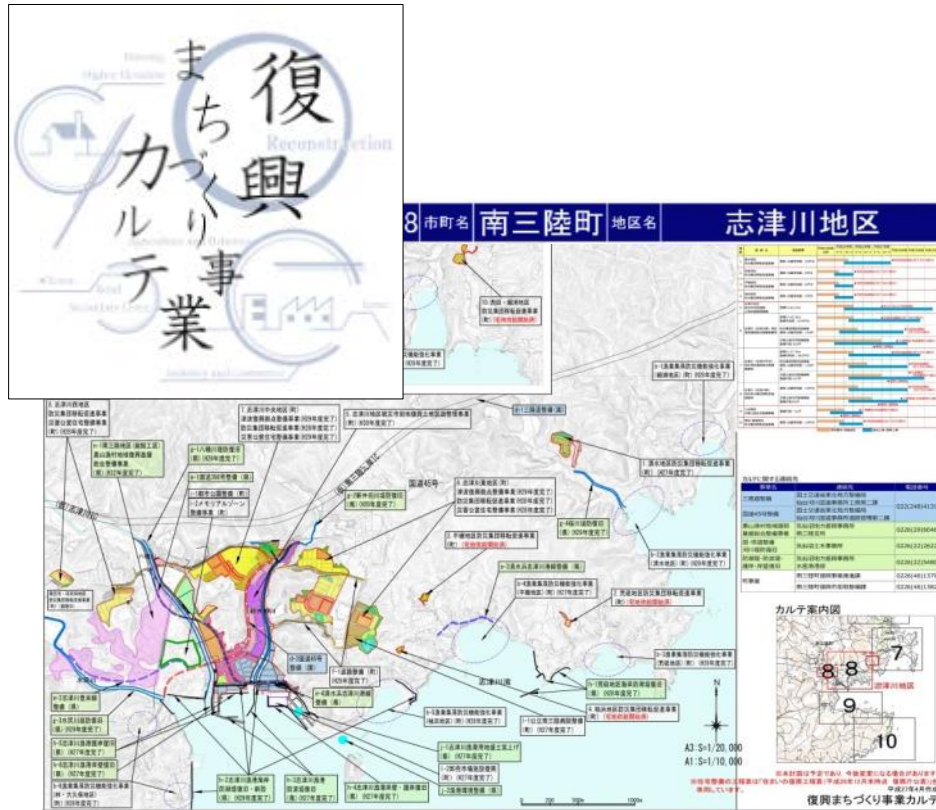

●国、県、各市町の復旧・復興工事の箇所・期間を記載した**事業カルテ**を定期的に更新し公表

- 事業間調整による**工事の加速化！**
- 被災者が復興を実感できるよう地域の**将来像を明示！**

## ■ 復興まちづくりの状況を広く発信

みやぎの  
Miyagi Prefectural Government  
復興まちづくり  
Post-Disaster Community Development  
パネル展  
Exhibition

海と生きる

気仙沼市(半島部)

- 東京都庁第一本庁舎南展望室  
H27.12.23 (水) ~27 (日)
- 東京日本橋地下歩道  
H28.1.18 (月) ~28 (木)
- 仙台市青葉通地下道ギャラリー  
H28.2.1 (月) ~12 (金)
- 福岡市役所1階ロビー  
H28.2.20 (土) ~26 (金)
- 大阪駅前曾根崎地下歩道PRコーナー  
H28.3.1 (火) ~11 (金)

●震災から5年の復興まちづくりの状況について**全国でパネル展を開催**

- 震災の**風化防止**と**引き続き被災地への支援のお願い！**
- 復興が進む被災地へ**誘う観光PR！**
