

令和2年度 渋滞対策箇所のモニタリング結果（国道13号 茨島交差点）

No.	交差点名称	市町村	特定要件	道路利用者会議からの要望
30	ばらじま 茨島交差点	秋田市	ピーク時渋滞損失時間182.6人時間/h以上	トラック協会、ハイヤー協会

対策事業【右折レーン延伸】

国道13号：60m→90mに延伸【R2年6月3日完了】



対策前後の渋滞長・速度状況


- 茨島交差点の西流入方向の旅行速度は、朝ピーク時は0.3～2.1km/h向上。夕ピーク時も速度向上しているが、ピーク時は20km/h以下の状況【要件該当】

開通後の状況




対策前

既設右折レーン60m

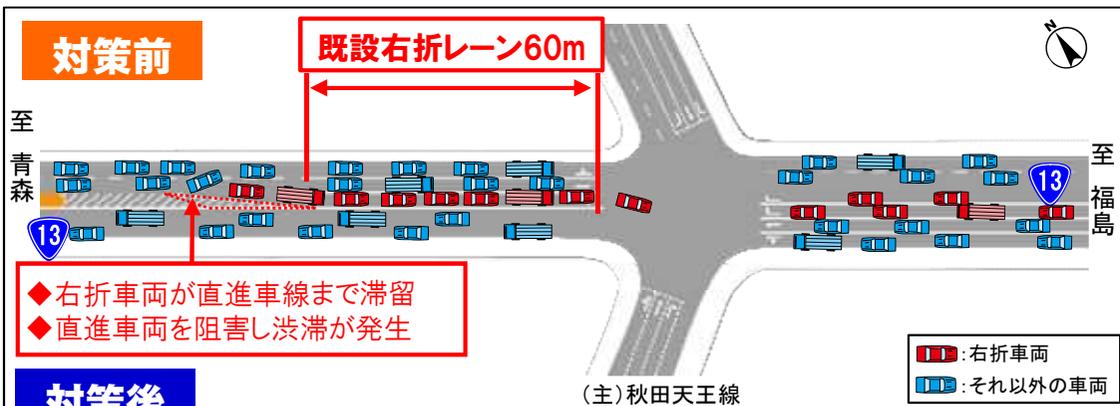


対策後

右折レーンの延伸(60m→90m)

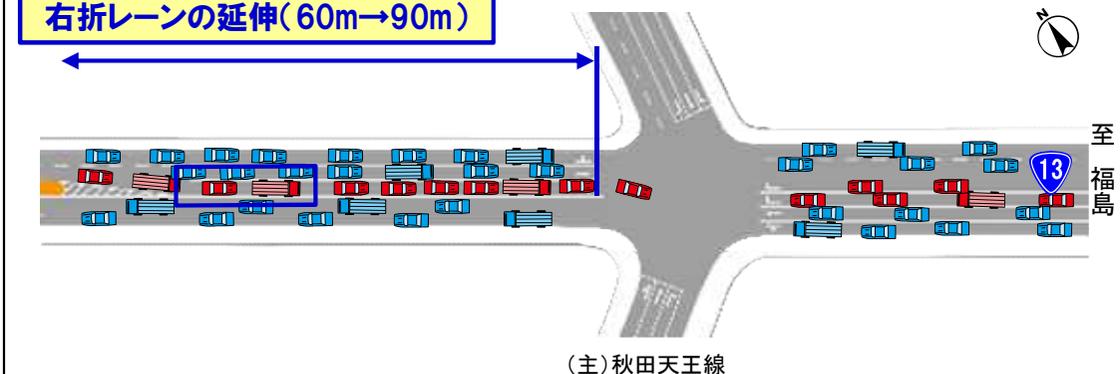

▼茨島交差点（西流入方向）の朝夕ピーク時旅行速度

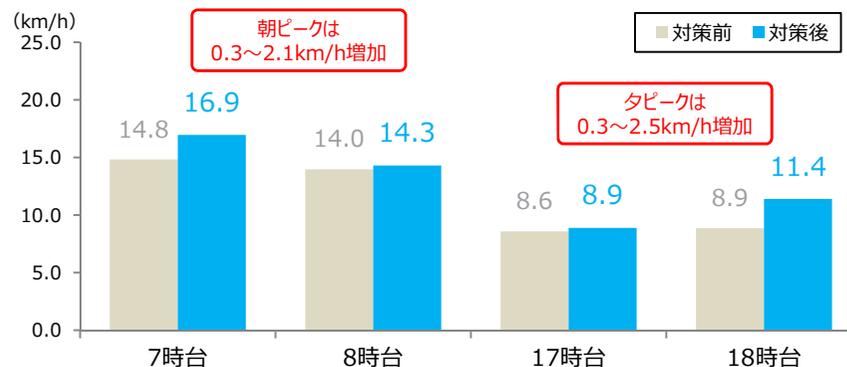

出典：ETC2.0データ、平日（対策前：R1.4～6月、開通後：R2.7月）

対応方針

- 速度のモニタリングを継続し、混雑状況の変化を把握
