

鶴岡市田麦俣地区の防災情報(第2報)

新庄河川事務所では、通行止めしている市道中台線の地すべり監視を継続しています。本日まで、地盤伸縮計の増設、監視カメラ新設等監視体制の強化に合わせ対策工に着手しました。

早期の通行止め解除に向けて引き続き対応していきます。

1. 新庄河川事務所の体制

9月8日(火)11時00分 災害対策支部(警戒体制・地すべり)設置

9月11日(金)17時00分 災害対策支部(警戒体制・地すべり)継続中

2. 監視体制(24時間対応)

・地盤伸縮計 3箇所 (9月11日2箇所設置済み、12日1箇所設置予定)

・監視カメラ 1台 (9月9日設置済み)

・回転灯 1箇所 (9月9日設置済み)

3. 対策工

・表面排水工 一式 (完成予定:9月16日)

※今後の降雨等により、完成予定日は変わる可能性があります

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 新庄河川事務所

山形県新庄市小田島町5-55

TEL:0233-22-0256(工務第二課直通)

TEL:0233-22-0262(調査課直通)

副所長(砂防) 佐藤 勝美(内線205)

工務第二課長 藤原 孝徳(内線321)

調査課長 田村 公仁(内線351)


市道中台線通行止めに関する問合せ先

鶴岡市南部建設事務室

TEL:0235-53-2111(代表)

室長 伊藤 哲哉

位置図

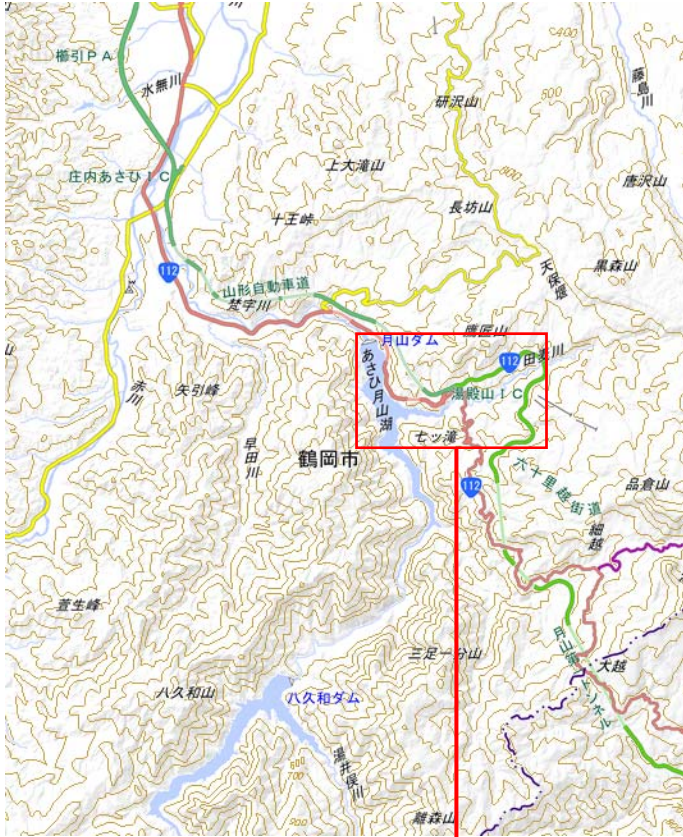


詳細図



市道変状箇所

凡例	
-----	市道中台線
-----	地すべり防止区域

平面図

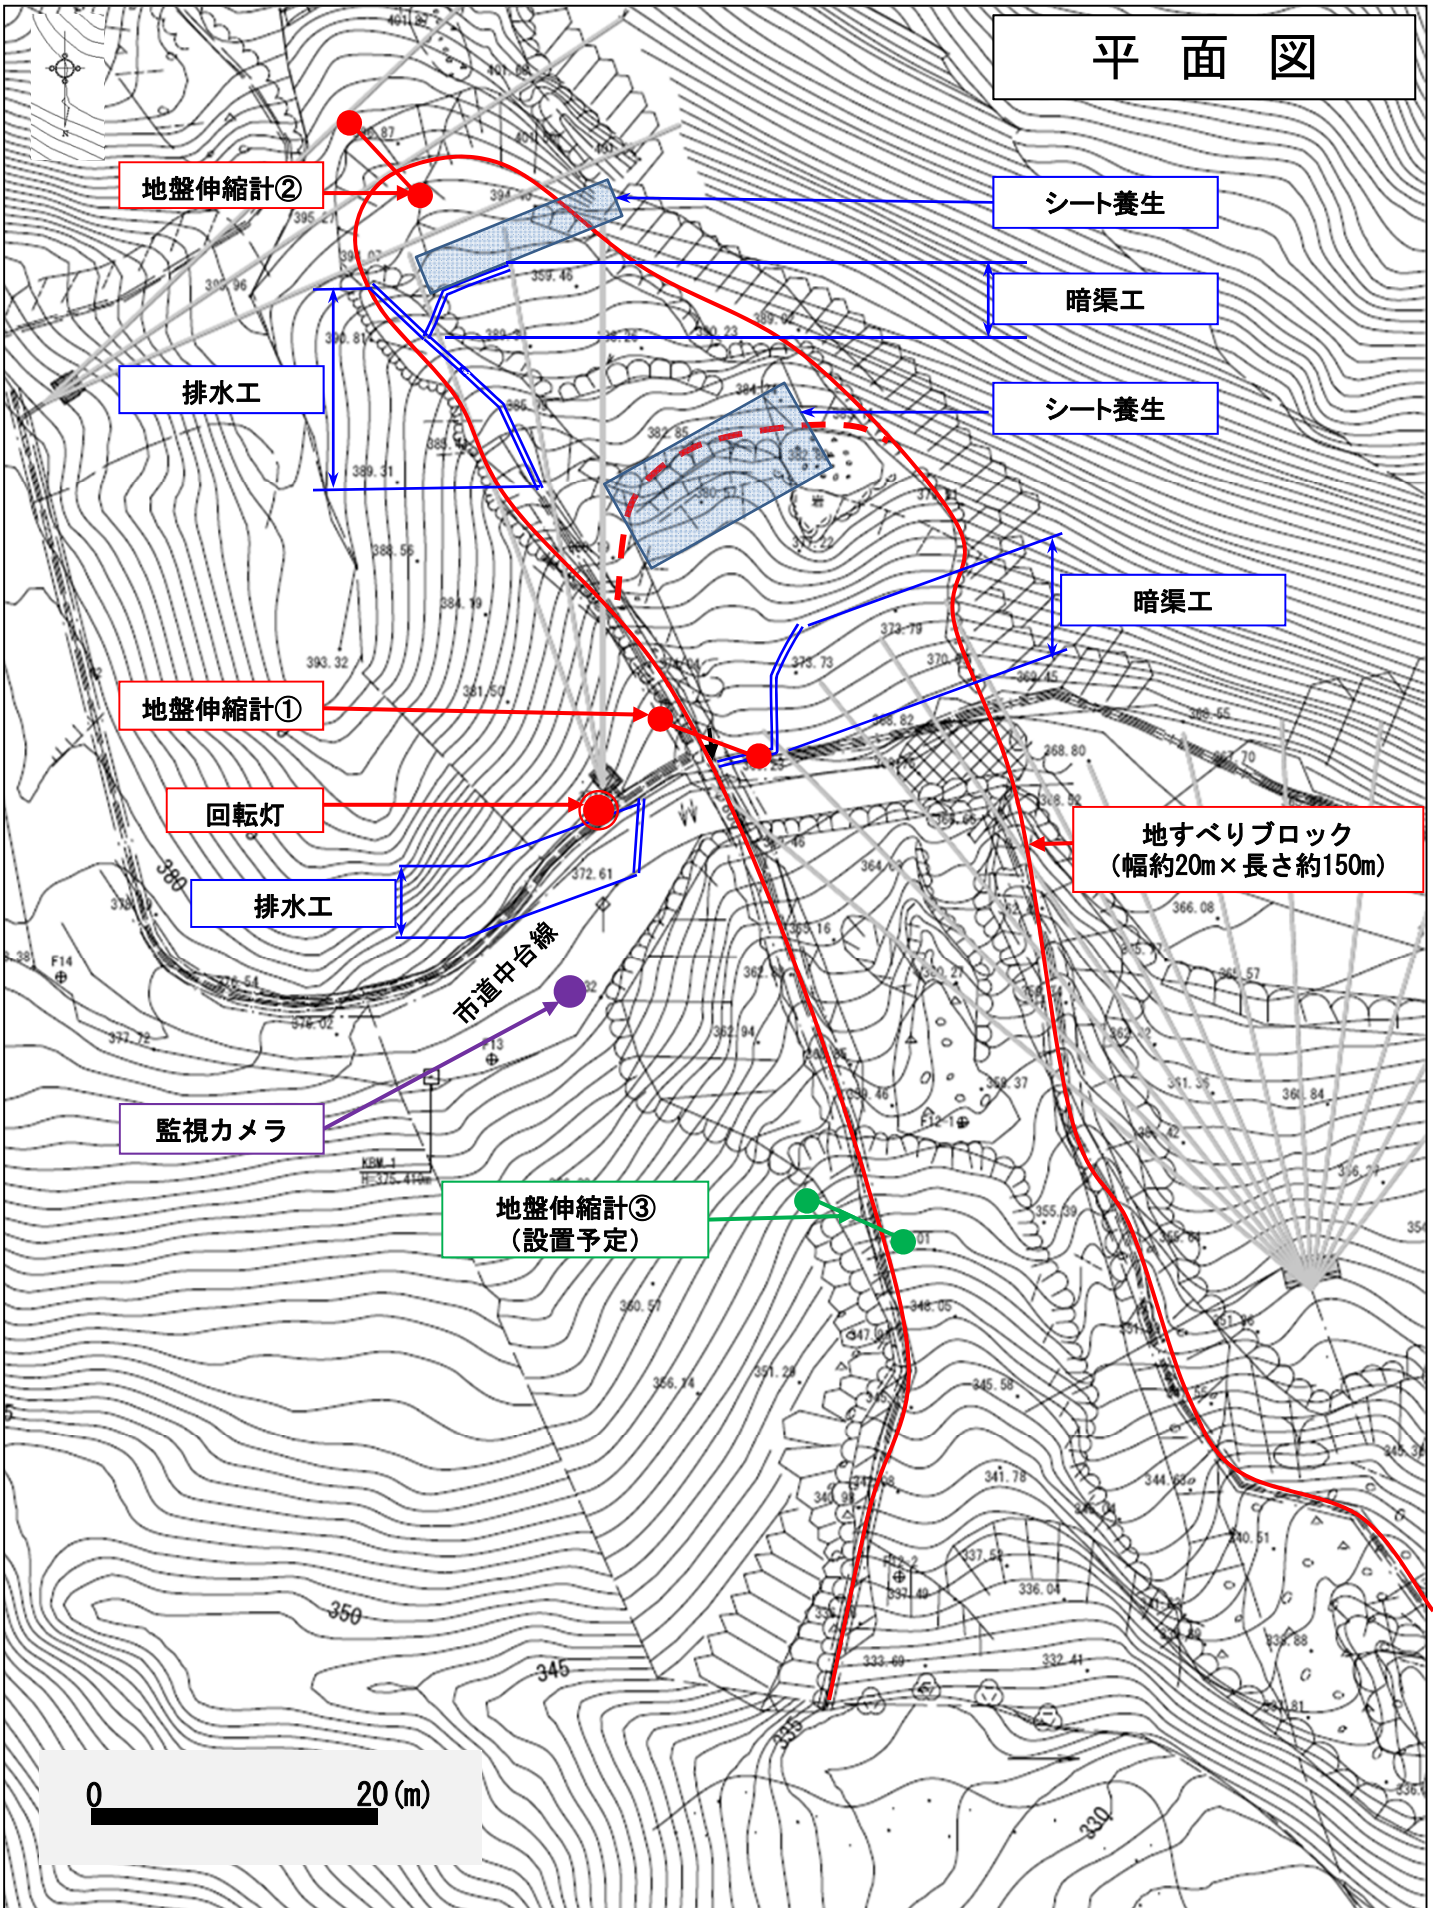

地盤伸縮計②

シート養生

排水工

シート養生

地盤伸縮計①

暗渠工

回転灯

地すべりブロック
(幅約20m×長さ約150m)

排水工

監視カメラ

地盤伸縮計③
(設置予定)

0 20 (m)

新庄河川事務所の対応状況



※田村事務所長(専門家)による現地調査の実施



※地盤伸縮計、回転灯の設置状況
