

【ゆきみち緊急情報】（記者発表）

山形河川国道事務所
酒田河川国道事務所

国道112号通行止めに関する防災情報(第5報)

国道112号の山形県西村山郡西川町大字志津地内において、雪崩1ヶ所(延長20m、幅8m、高さ1.5m)による交通障害が発生したため、現在、国道112号が通行止めとなっています。

西川町大字月山沢字石御堂ヶ嶽 地内（荒沢駐車帯）
～ 鶴岡市上名川 地内（上名川除雪ステーション）（L＝約27km）

本日2月14日、雪庇除去作業、雪崩防止柵背面の堆雪スペース確保作業を継続しているほか、雪崩発生箇所で雪崩を導流する雪堤および導流路の設置作業を行っています。

天候の状況によりますが、明日15日中の通行止め解除を目指して作業を進めています。

今後の予定については、下記のとおりですが、開通の見通しおよび作業の進捗等については、2月15日10時ごろに発表予定です。

ご理解とご協力をお願いします。

■本日の作業

- ・雪庇除去作業
- ・雪崩防止柵背面の堆雪スペース確保作業
- ・雪崩発生箇所の雪堤および導流路の設置

2月14日（土）16時時点
（月山IC～月山第一トンネル山形側間（延長6.6km））

	作業対象箇所	作業終了
雪庇除去作業	11ヶ所	完了
雪崩防止柵背面の堆雪スペース確保作業	20ヶ所 (1.5km)	18ヶ所 (1.3km)
雪崩発生箇所の雪堤および導流路の設置	1ヶ所	作業中

今後も降雪が続く予想となっているため、作業済みの箇所を再度除雪する場合があります。

■今後の予定

- ・雪崩防止柵背面の堆雪スペース確保作業
- ・雪崩発生箇所の雪堤および導流路の設置
- ・全作業完了後、専門家による現地調査

■降雪状況（2月14日16時時点）

月山第一トンネル山形側 地点

降雪量 35cm（24時間降雪量）

【これまでの経緯】

■雪崩発生日時

平成27年 2月11日 19時40分頃

■雪崩発生場所

山形県西村山郡西川町大字志津地内 雪崩1ヶ所(延長20m、幅8m、高さ1.5m)

■全面通行止め区間(継続)

区間：国道112号 西村山郡西川町大字月山沢字石御堂ヶ嶽 地内(荒沢駐車帯)
～鶴岡市上名川 地内(上名川除雪ステーション)

延長：約27km

■迂回のお願

国道47号または、国道113号を迂回ください(資料1参照)。

問い合わせ先
国土交通省 東北地方整備局 山形河川国道事務所 TEL023(688)8421 計画課長 <small>やまき</small> 山木 <small>のりお</small> 紀雄 (内線 261)


広域迂回路図

通行止め区間位置図

広域迂回路(山形市～酒田市まで)
国道13号～47号～7号をご利用ください

《通行止め区間》約27km
国道112号
西村山郡西川町大字月山沢字石御堂ヶ嶽地内
～ 鶴岡市上名川地内
詳細は、【資料2】をご覧ください。

広域迂回路(山形市～酒田市まで)
国道13号～113号～7号をご利用ください

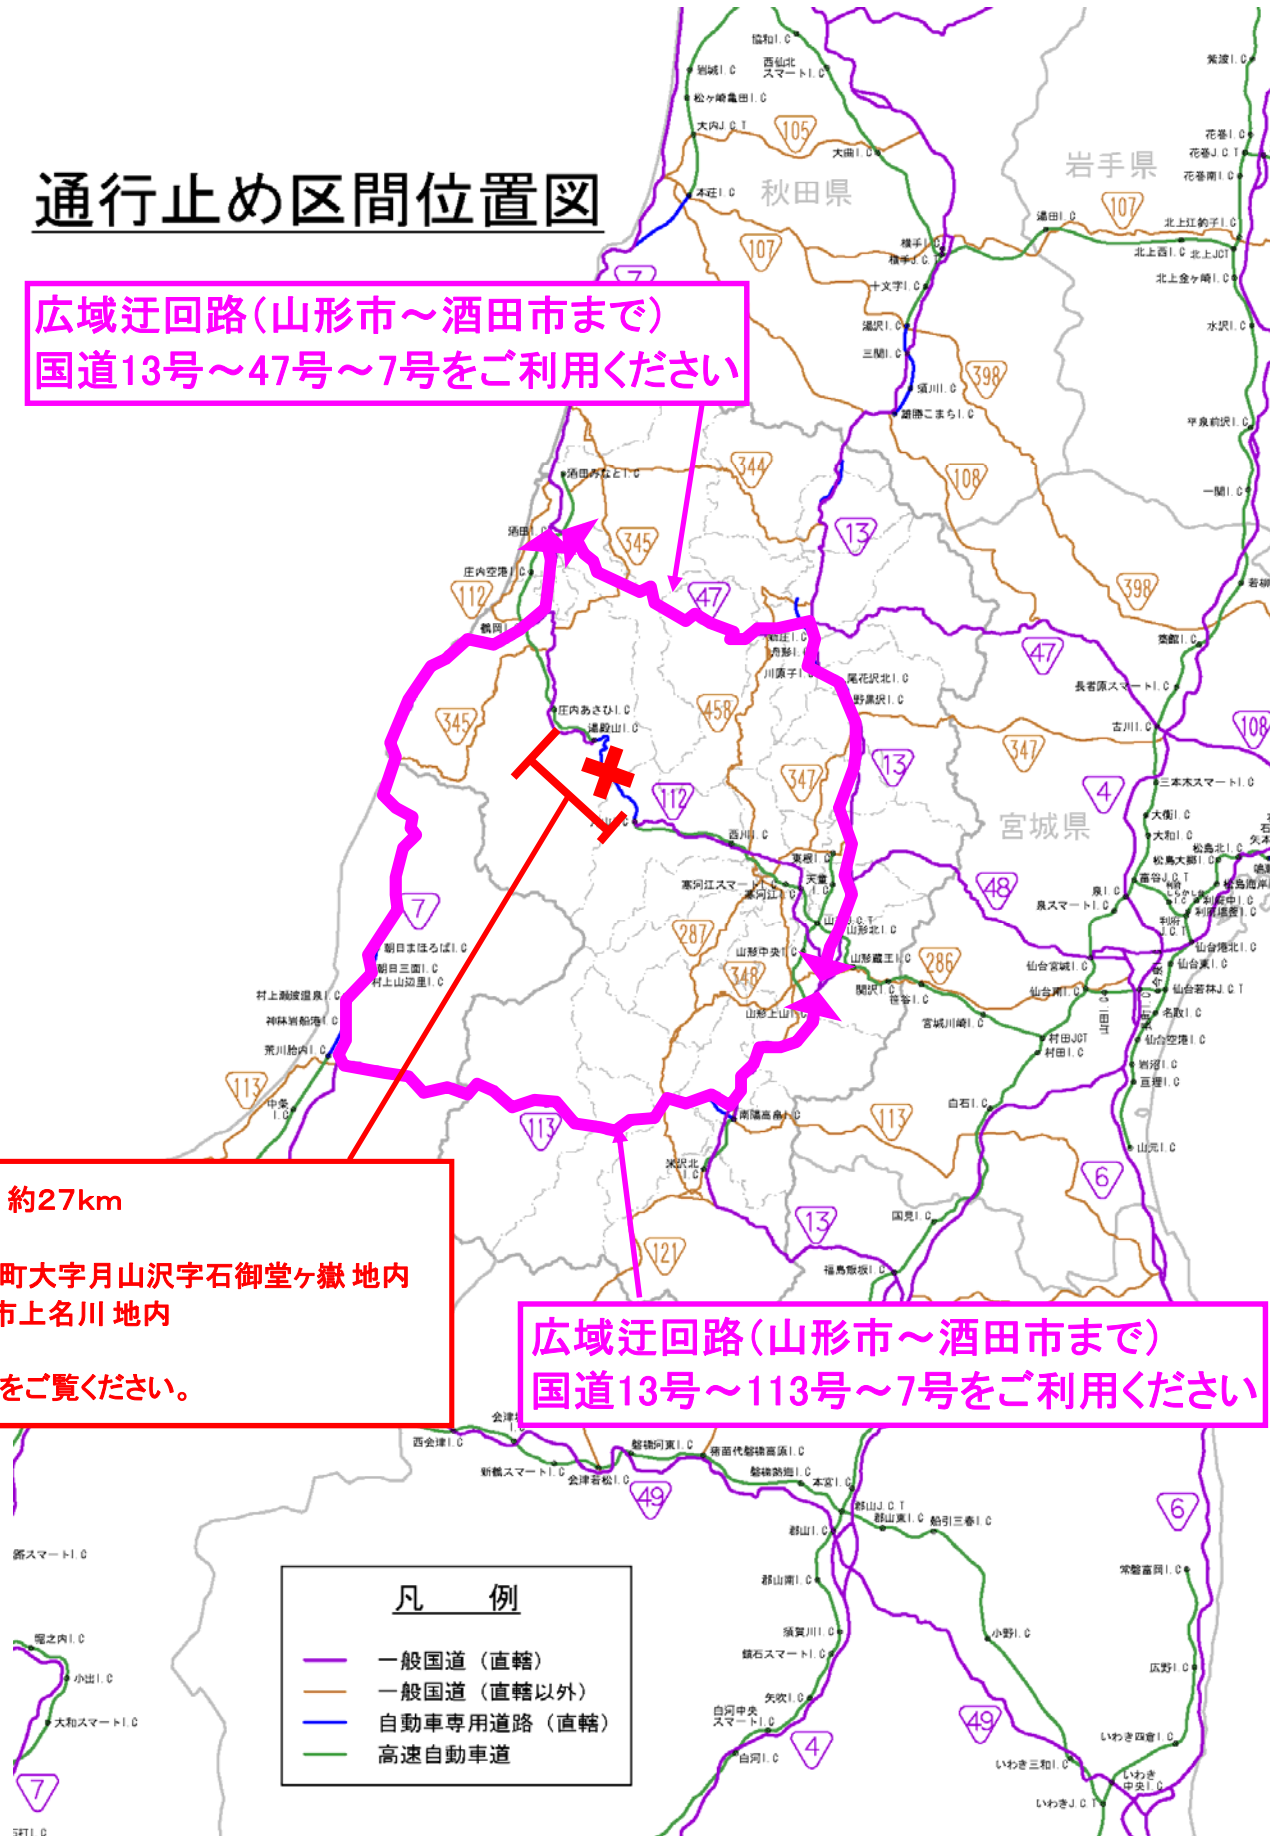

凡 例	
	一般国道（直轄）
	一般国道（直轄以外）
	自動車専用道路（直轄）
	高速自動車道

国道112号 通行止め区間位置図

広域迂回路については、【資料1】をご覧ください。

《通行止め区間》約27km
国道112号
西村山郡西川町大字月山沢
字石御堂ヶ嶽 地内（荒沢駐車帯）
～ 鶴岡市上名川 地内（上名川除雪ステーション）



国道112号(旧道) 冬期閉鎖
西村山郡西川町大字志津 地内
～ 鶴岡市田麦俣 地内


雪崩発生箇所

志津温泉方面へは
通行可能です



大井沢方面
通行可

至 西川IC

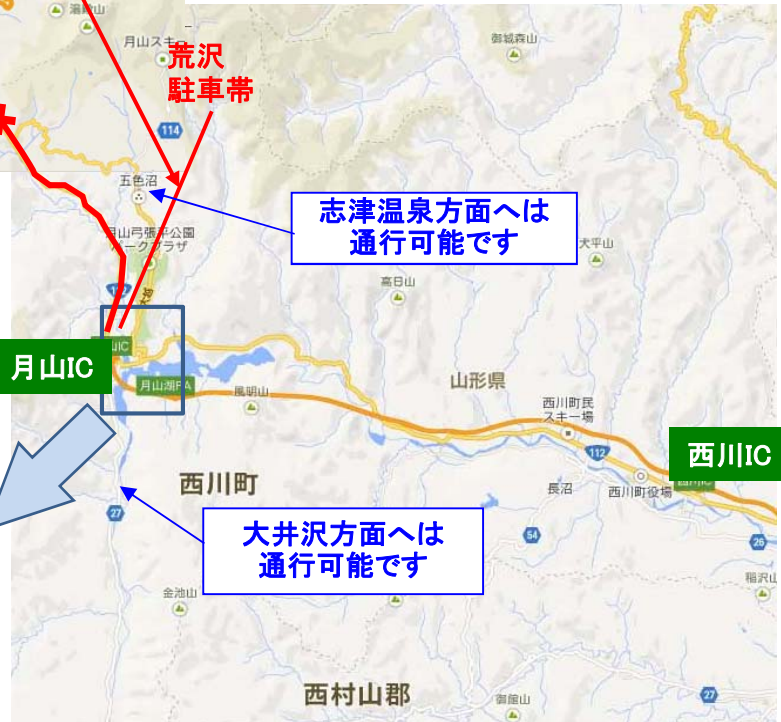

大井沢方面へは
通行可能です

2月13日夜から14日の作業状況



雪崩柵背面の堆雪スペース確保作業



雪庇除去作業



雪崩発生箇所の雪堤および導流路の設置作業
