



## 前線に伴う降雨による防災情報 (第9報:終報)

新庄河川事務所では、8月31日(金)3時30分、災害対策支部(警戒体制・河川)を設置していましたが、9月3日(月)15時00分に鮭川村川口泉田川右岸0.5kの緊急復旧工事が完了しましたので、9月3日15時00分に災害対策支部(警戒体制・河川)を解除します。

## 1. 事務所体制 【最新の体制】

砂防	防	2018/8/31	0時00分	立谷沢川流域	警戒
砂防	防	2018/9/1	13時10分	全流域	解除
河川	川	2018/8/31	3時30分	鮭川流域	警戒
河川	川	2018/9/3	15時00分	鮭川流域	解除

## 2. 緊急復旧工事 (詳細は次ページ参照)

- 【河川】 ○日時:平成30年8月31日(金) 20時工事着手  
○場所:山形県最上郡鮭川村大字川口地先  
○水系名:最上川水系鮭川支川泉田川  
○工期:平成30年8月31日(金) 20時00分  
平成30年9月3日(月) 15時00分 完了

新庄河川事務所記者発表についてはホームページでご覧になれます。  
○新庄河川事務所Webサイト <http://www.thr.mlit.go.jp/shinjou/>  
〈記者発表:新庄新聞放送記者会〉

国土交通省 東北地方整備局 新庄河川事務所  
〒996-0071 新庄市小田島町5-55 TEL:0233-22-0251(代表)

副所長(河川担当) 後藤 浩志 (内線204)

工務第一課長 高橋 正寿 (内線311)

# 平成30年8月31日出水(前線) 堤防護岸の緊急復旧

○今回の出水により、鮭川村川口地内の泉田川右岸0.5kの堤防護岸が洗掘されたため、緊急復旧工事を実施しました。



緊急復旧箇所: 鮭川支川泉田川右岸0.5k  
(鮭川村川口地区)  
被災内容: 堤防護岸洗掘  
復旧延長: 24m



▲ 堤防護岸被災状況

## 【進捗状況】

○復旧工事着手  
8/31 20:00

○復旧工事完成  
**9/3 15:00**




▲ 緊急復旧完成状況(9月3日 15時時点)



▲ 緊急復旧状況(9月1日 18時40分時点)

# 平成30年8月31日出水(前線) 堤防護岸の緊急復旧

○復旧工事では、真室川防災ステーションに備蓄されている3 tブロック109個を使用し、速やかな復旧を行いました。

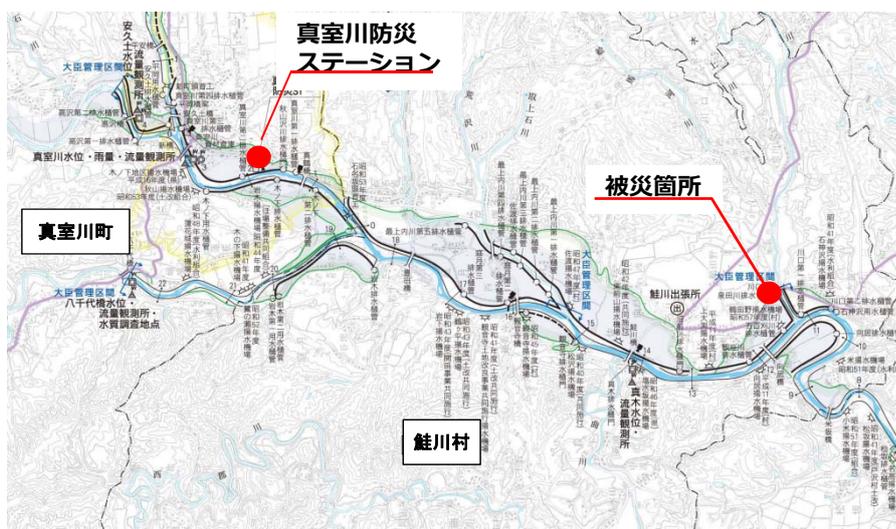

真室川防災ステーション



備蓄されている3 tブロック

3 tブロック搬出状況

※防災ステーションに関する情報は、下記のURLよりご覧ください。

[http://www.thr.mlit.go.jp/shinjyou/01\\_bousai/bousai-station/bousai-station.html](http://www.thr.mlit.go.jp/shinjyou/01_bousai/bousai-station/bousai-station.html)
