

がんばろう！東北

【防災情報】（記者発表） 仙台河川国道事務所 防災情報（第97報）

国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所
平成23年 4月28日18時00分発表

平成23年3月11日（金）14時46分頃発生した三陸沖を震源とする地震により、仙台河川国道事務所管内では、震度7を観測しました。

このため、仙台河川国道事務所では、14時46分に非常体制に入りました。

また、平成23年4月7日（木）23時32分に発生した宮城県沖を震源とする余震により管内最大震度6強を観測しました。

多発している余震を含め、所管施設の点検と復旧作業を実施しております。

今後の情報に十分な注意をお願いします。

※ アンダーラインは、第96報からの追加・変更の情報です。

1. 仙台河川国道事務所の体制について

- 1) 非常体制 3月11日14時46分に災害対策支部を設置
- 2) TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）の調査について
河川・道路において、被災状況調査を実施

2. 所管施設の状況

1) 河川

(1) 被災状況等

阿武隈川 57カ所の被災が確認されております。

（堤防の亀裂・法面崩壊・堤防の沈下）

※ 被災直後から、シート張やアスファルト乳剤の注入などを応急的に実施し概成しました。

今後の雨に備えた大型土嚢1,700袋の備蓄作業は完了しました。

なお、応急復旧対応した箇所のうち、本格的な復旧箇所は

○阿武隈川左岸の河口から0.4km～1.0km（岩沼市寺島地先）において、津波により堤防が大きく削られた箇所。

本日完了しました。（別添参照）

○阿武隈川右岸の河口から4.7km付近（亘理町高須賀地先）において、堤防の沈下箇所。

完了は5月10日の見込みです。

○阿武隈川左岸の河口から11.8km付近（岩沼市南長谷地先）において、深さが大きな堤防の亀裂箇所。

完了は4月30日の見込みです。

○阿武隈川右岸の河口から18.6km付近（角田市平貫地先）において、深さが大きな堤防斜面の亀裂箇所。
完了は5月11日の見込みです。

○阿武隈川左岸の河口から36.4km付近（丸森町舘矢間地先）において、深さが大きな堤防の亀裂箇所に本日着手しました。
完了は5月2日の見込みです。（別添参照）

名取川 35カ所の被災が確認されております。
（堤防の亀裂・堤防の沈下）

※ 被災直後から、アスファルト乳剤の注入などを応急的に実施し概成しました。

今後の雨に備えた大型土嚢2,000袋の備蓄作業は完了しました。
なお、応急復旧対応した箇所のうち、本格的な復旧箇所は

○名取川左岸の河口から0.9km～2.0km（仙台市若林区種次地先）において、深さが大きな堤防の亀裂箇所。

本日完了し、がれき処理等の経路を確保しました。（別添参照）

※ 仙台市の要請により、排水ポンプ車5台で若林区井土地区の浸水解消作業中。

（2）緊急復旧工事

東北地方太平洋沖地震により、被害を受けた阿武隈川下流堤防に対して下記のとおり緊急復旧工事を5月下旬を目指し実施しております。

阿武隈川下流堤防緊急復旧工事		
市町村	場 所	工 事 内 容
亘理町	荒浜地区	堤防復旧 延長270m
角田市	坂津田地内	堤防復旧（仮締切等） 延長 80m
角田市	野田地区	堤防復旧（仮締切等） 延長330m
角田市	上沼尻地	堤防復旧（仮締切等） 延長320m
角田市	枝野地区	堤防復旧（仮締切等） 延長250m
角田市	賀川地区	堤防復旧（仮締切等） 延長230m
丸森町	小斉地区	堤防復旧（仮締切等） 延長270m

2) 海 岸

(1) 緊急復旧工事

東北地方太平洋沖地震により、被害を受けた仙台湾南部海岸において、海岸線の浸食が著しい山元町の中浜工区の一部工区から、順次、堤防の緊急復旧工事に着手しています。

今後は岩沼市の蒲崎海岸、山元町の笠野海岸においても調査、測量が終わり次第に順次、工事を開始する予定であり、8月末の緊急復旧工事完成を目指し実施しております。

仙台湾南部海岸緊急復旧工事			
市町村	場 所	工 事 内 容	
山元町	中浜海岸	緊急復旧	延長 6,500m
山元町	笠野海岸	緊急復旧	延長 1,700m
岩沼市	蒲崎海岸	緊急復旧	延長 2,100m

3) 道 路

○通行不能の箇所は以下のとおりです。

国道 45号 石巻市河北町大字成田地内 0.1km 法面崩落
(迂回路のための規制区間 9.0km)

国道 45号 小泉大橋(気仙沼市本吉町)等 0.6km 落橋
4月22日(金)より、仮橋工事に着手しました。

※ 水尻橋(南三陸町志津川)は仮橋にて片側交互で通行可能
(ただし、特殊車両は国道346号・398号を迂回してください)

※ 二十一浜橋(気仙沼市本吉町)は仮橋にて2車線通行可能

※ 歌津大橋(南三陸町歌津)は、迂回路(県道及び町道)を直轄国道に区域編入しました。

現在、道幅の狭い箇所の拡幅工事中で、4月28日(木)から4月30日(土)の夜間(PM7:00~翌朝AM6:00)は、通行止とするので迂回路を通行してください。

(別添チラシ参照)

※ 迂回路に関しては、東北地方整備局ホームページを参照(下記をクリック)

http://www.thr.mlit.go.jp/road/jisinkannrenjouhou_110311/ukairo.html

○出張所の被災状況

気仙沼国道維持出張所 津波により損壊。現在、水梨コミュニティセンター(気仙沼市赤岩迎前田地内)へ仮移転しています。

※ ご通行の際は、安全な速度で十分注意し、走行していただきますようお願いいたします。

<発表記者會:宮城県政記者會、東北専門記者會>

お 問 い 合 わ せ 先


国土交通省 東北地方整備局 仙台海川国道事務所 TEL 022(248)4131

(広報)計画課長 木越 養一(内線261)

ホームページURL <http://www.thr.mlit.go.jp/sendai/>

津波により堤防が大きく削られた箇所を補修を完了

●阿武隈川 [左岸河口から0.4k~1.0k付近 岩沼市寺島地先]

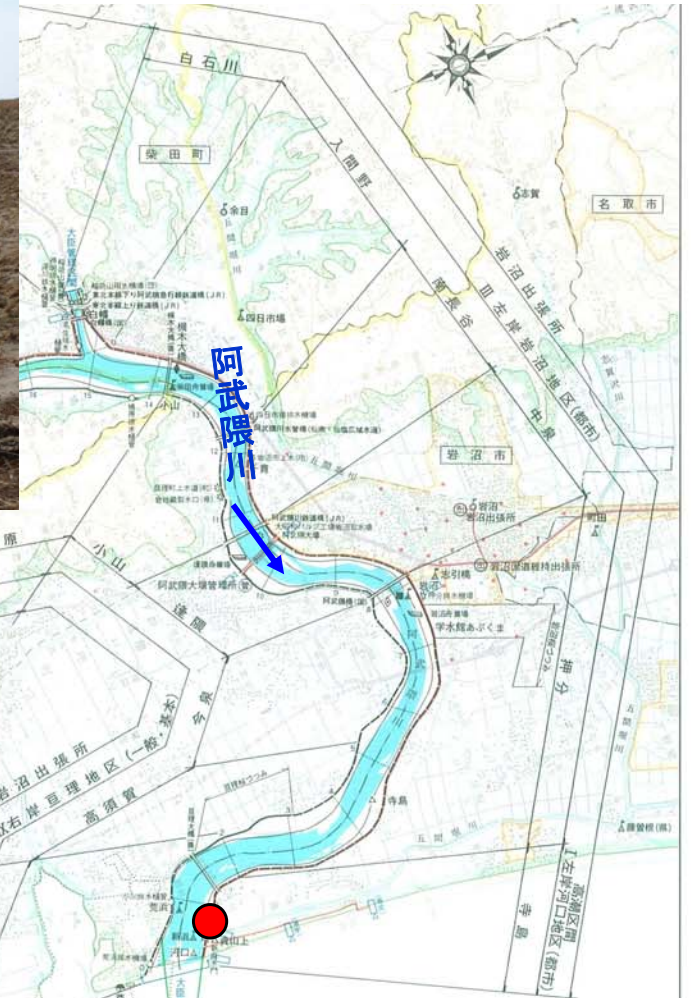

0.4k~1.0k付近の被災状況




補修完了(4/28 14時撮影)

左岸河口から
0.4k~1.0k付近
【被災延長約600m】

堤防の亀裂箇所の補修に着手

●阿武隈川 [左岸河口から36.4k付近 丸森町館矢間地先]

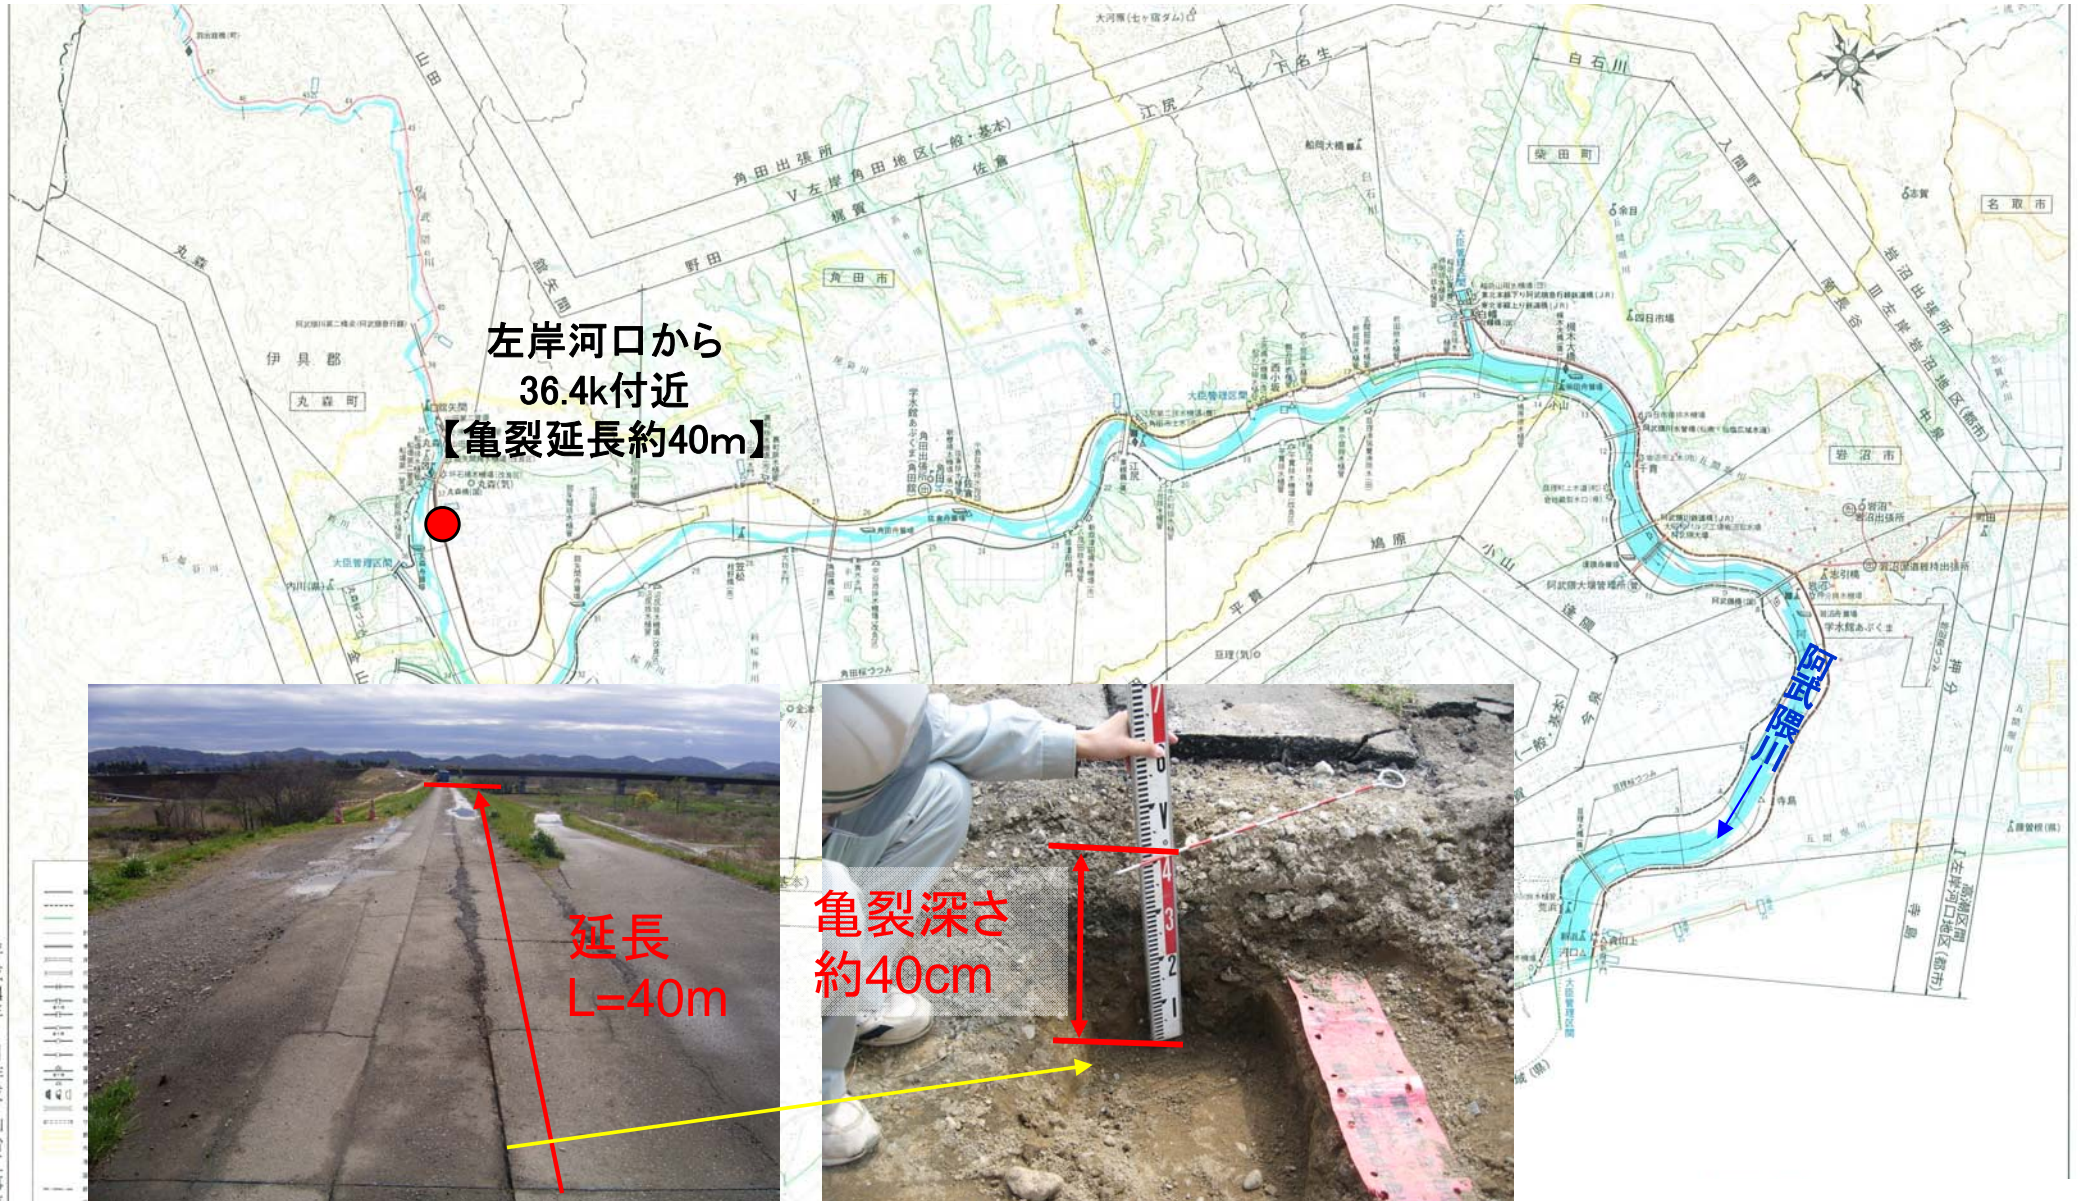

36.4付近の被災状況

堤防の亀裂箇所への補修を完了し、 がれき処理等の経路を確保

● 名取川 [左岸河口から0.9k~2.0k付近 仙台市若林区種次地先]



2.0k付近の被災状況



東北地方整備局仙台河川国道事務所



【災害復旧・緊急工事】

国道45号(歌津地区)拡幅工事による通行止めのお知らせ



一般国道45号の歌津地区で拡幅工事のため、夜間施工による通行止めを下記の日程のとおり行いますので、御協力をお願いします。

1. 場 所 宮城県本吉郡南三陸町歌津伊里前
2. 規制内容 **通行止(迂回路を通行してください)**
(現地の案内看板に従い通行して下さい。迂回路は、大型車両の通行は出来ません。)
3. 規制月日 平成23年4月28日(木)
～平成23年4月30日(土)
作業時間 **PM7:00～翌朝AM6:00**
(上記、期間内は昼間施工も併せて実施します。)

(発表記者会 宮城県政記者会 東北専門記者会)

◎お問い合わせ

国土交通省 仙台河川国道事務所 道路管理第一課	022-248-4131
国土交通省 仙台河川国道事務所 気仙沼国道維持出張所	0226-23-5801
日本道路交通情報センター(仙台)	050-3369-6604
株式会社 瀬崎組	0225-22-4634
